



الجمهورية التونسية



الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية



وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري  
المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان

# تقدم إنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بالقيروان

يوم إعلامي للتعريف بالمشروع: 22 سبتمبر 2022

إعداد وتقديم: محسن مسطور

تقدم إنجاز المشروع  
(إلى غاية 22 سبتمبر 2022)

## انطلاق المشروع

• **11 ماي 2021** : دخول المشروع حيز التنفيذ بعد صدور قانون اتفاقية القرض

من **28 جوان- 02 جويلية 2021** تم برمجة ورشة انطلاق المشروع

تم إلغائها نظرا لدخول ولاية القيروان في حجر صحي شامل.

وبذلك كان الانطلاق الفعلي للمشروع في **جوان 2021**

## فريق المشروع

- أكتوبر 2020 تم الإعلان عن شغورات خطط لوحدة التصرف في كامل المندوبيات فتحصلنا على نسبة 40 % من تركيبة الفريق، 
- تم تكليف فريق وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع بقرار من السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- خلال شهر ماي 2022 تم تدعيم فريق المشروع بفنيين من المندوبية على إثر طلبهم للالتحاق بوحدة المشروع اتصل التركيبة إلى نسبة 70%،
- تم انتداب خبير كمستشار فني للمشروع خلال شهر سبتمبر 2022 حسب توصيات الممول في مذكراته لتدعيم الوحدة والإسراع في انجاز عناصر المشروع،
- في انتظار دعم وحدة المشروع بإطارات عن طريق المساعدة الفنية (AT) المبرمجة ضمن اتفاقية القرض (14 إطار).

## التركيبة الحالية لفريق المشروع

- منسق المشروع: محسن مسطور
- مصلحة التأقلم مع التغيرات المناخية: عفيف زقاري
- مصلحة المتابعة الفنية: أحمد بركات
- مصلحة التصرف المالي: نزيهة الرحماني
- مصلحة المنظومات والشراكة: صالح حمدي
- مصلحة الادمج الاقتصادي: نجية ادريس
- مصلحة الصفقات: أميرة الراحي
- مصلحة التواصل وإدارة المعرفة: سماح قلاوي

## التكوين الأولي لإطارات المشروع

في **نوفمبر 2021** : نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورات تكوينية لإطارات المشروع والدوائر الفنية شملت المحاور التالية:

- الصفقات
- التصرف المالي
- التغيرات المناخية
- المتابعة والتقييم
- الشفافية وسياسة مكافحة الفساد

## إحداث لجان لمتابعة المشروع

• تم بتاريخ **26 نوفمبر 2021** : احداث اللجنة الوطنية ( بمقرر من السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري )


• تم بتاريخ **28 جانفي 2022** : احداث اللجنة الجهوية و 7 لجان محلية بمعتمديات منطقة المشروع ( بمقررات من السيد والي القيروان )

## عناصر المشروع

يتكون المشروع من **03 عناصر**:

- تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل
- الإدماج الاقتصادي ودعم المنظومات المحلية المستدامة
- تسيير المشروع - المتابعة والتقييم وإدارة المعرفة

ينقسم كل عنصر إلى **03** عناصر فرعية



# تقدم إنجاز العنصر الأول

(تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل)



## تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل

**الهدف:** تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل. وينقسم هذا العنصر إلى 3 عناصر فرعية:

• 1.1. إعادة تهيئة البنية التحتية الاجتماعية،

• 2.1. دعم قدرات الأسر الريفية،

• 3.1. دعم الأنشطة المدرة للدخل.

# تقدم إنجاز العنصر 1.1

(إعادة تهيئة البنية التحتية الاجتماعية)



## 1.1. إعادة تهيئة البنية التحتية الاجتماعية

أهم الأنشطة التي تم إنجازها منذ انطلاق المشروع هي:

- إعداد دراسات لإعادة تهيئة 05 مشاريع ماء صالح للشراب ( قصر لمسة بالوسلاتية ، عريية والدبابشة بالعلا ، السرجة بالحاجب والرحمة بحفوز): بنسبة تقدم إ. (40% )،
- تم الإعلان عن طلب عروض لإعادة تهيئة مشروع م ص ش المسلسل بحفوز ،
- سيتم الإعلان عن طلب عروض لإعادة تهيئة مشروع م ص ش مقرة بعين جلولة خلال شهر اكتوبر 2022،
- بصدد إعداد الخطوط المرجعية لإعداد دراسة لتجهيز 04 آبار عميقة بالطاقة الشمسية.

## تقدم إنجاز العنصر 2.1

(دعم قدرات الأسر الريفية)



## 2.1. دعم قدرات الأسر الريفية

(1)

كل **الأنشطة** التي تدعم العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل تنجز في إطار اتفاقية ثلاثية بين:

- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- وزارة الشؤون الاجتماعية
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

تم إبرامها في **جويلية 2021** ←

تم خلال شهر **أوت 2021** إبرام اتفاقية خاصة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لانجاز ومرافقة العنصرين 2.1 و 3.1 وتطبيق منهجية التدرج: **Approche graduation**

## (2)

تعاهد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع المنظمة العالمية BRAC لدعم UTSS وقد قامت بالأنشطة التالية:

- تكوين فريق عمل جهوي متكون من : CRDA ، DRAS ، UTSS ، FIDA و BRAC لمراقبة تطبيق منهجية التدرج: Approche graduation (فيفري 2022)،
- إعداد الخطوط المرجعية لانتداب 14 منشط (فيفري 2022)،
- إعداد إستمارة دراسة الوضعية المرجعية في 03 وحدات نموذجية (سودان 1، 2 و 3) لتجربة التدرج (مارس 2022)،
- تكوين إطارات المشروع و UTSS على منهجية التدرج (مارس 2022)،
- إعداد دليل إجراءات لتطبيق منهجية التدرج (ماي 2022)،
- تكوين المنشطيين على منهجية التدرج (سبتمبر 2022)،
- إعداد دراسة السوق لعينة من الأنشطة المدرة للدخل. (نسخة أولية: جويلية 2022)

(3)

## وتنفيذا للاتفاقية قام UTSS بالأنشطة التالية:

- اختيار تشاركي لـ 03 وحدات نموذجية (سودان 1، 2 و3) (مارس 2022)،
- تم إعداد دراسة الوضعية المرجعية للوحدات النموذجية (أفريل 2022)،
- القيام بحملات مشتركة تحسيسية للتعريف بالمشروع (متواصلة)،
- تجميع المعطيات الأساسية عن 20 وحدة اجتماعية من جملة 36 وحدة في المجموعة الأولى (موفى سبتمبر 2022)
- انتداب 14 منشط(ة) (مارس 2022)،
- اقتناء وسائل نقل (جويلية 2022)،
- تكوين المنشطين (سبتمبر 2022).

(4)

كما قامت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالأنشطة التالية:

- توفير قائمة للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل في منطقة المشروع بتاريخ **05 أفريل 2022**،
- تحديد الوحدات الاجتماعية.

## (5) قاعدة بيانات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، تحيين 2021

105 وحدة اجتماعية

4948:

9634:

14582

عدد مناطق التدخل :

العائلات المعوزة

العائلات محدودة الدخل

العددجمالي




## اختيار المجموعة الأولى للوحدات الاجتماعية

- عمادات الوسلاتية/عين جلولة، العلا و حاجب العيون يسجلان:
- أكبر نسب فقر
- ونسبة انقطاع عن الدراسة مرتفعة.

الوسلاتية + عين جلولة : 40,9%

العلا: 38,3%

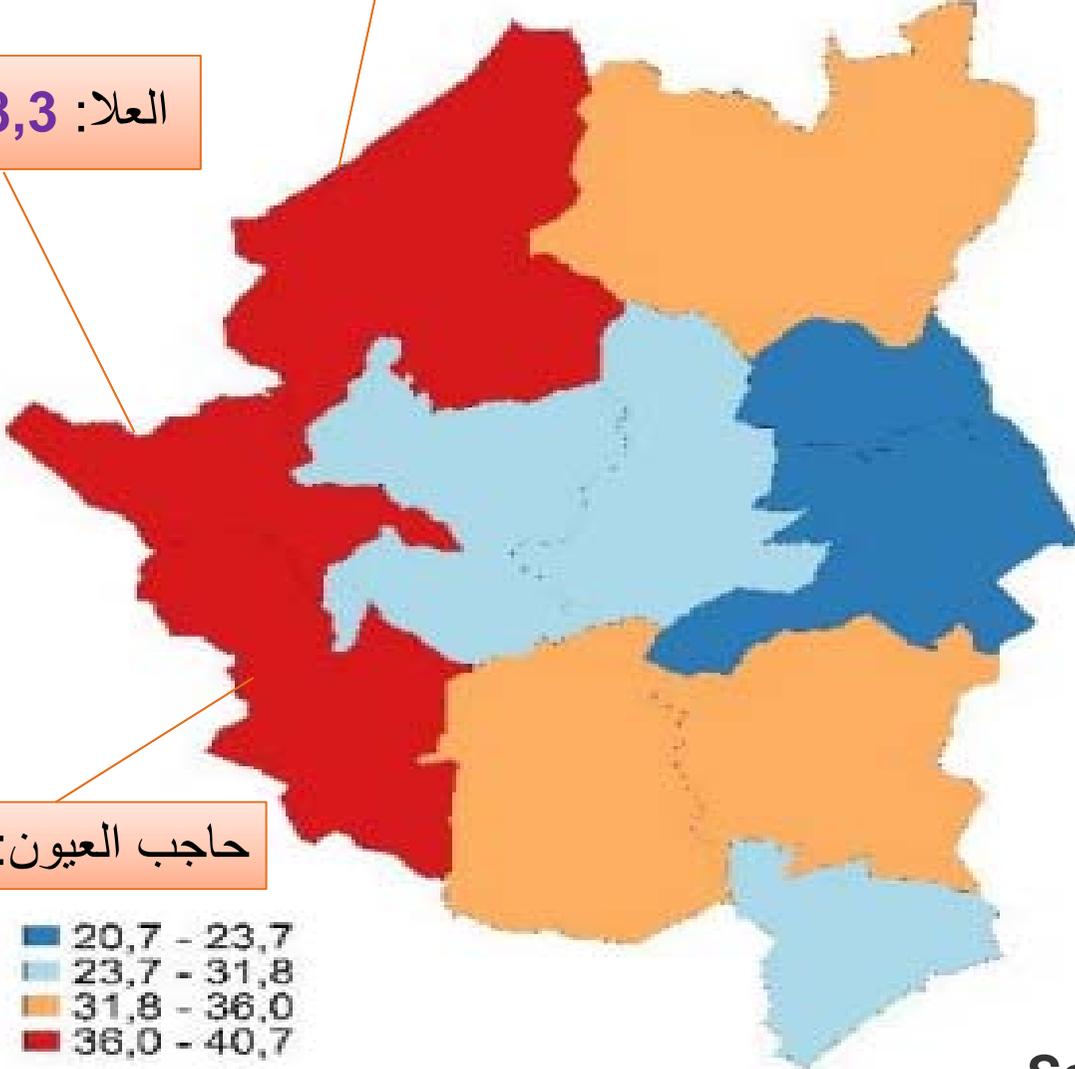

20,7 - 23,7  
23,7 - 31,8  
31,8 - 36,0  
36,0 - 40,7

حاجب العيون: 36,6%

a) Taux de pauvreté

Source : Données INS

(6)

وبذلك تم اختيار المجموعة الأولى من الوحدات وعددهم **36** من جملة 105 وحدة بتاريخ 28 جوان 2022 كالآتي:

المعتمدية	الوسلاتية	عين جلولة	العلا	الحاجب
عدد الوحدات الاجتماعية	21	06	06	03

العلا: عمادتي المساعيد وأولاد عمر

الحاجب: عمادة السرجة (السودان 1, 2 و 3)

وتم ارسال كل القوائم إلى السادة المعتمدين لمصادقة المجالس المحلية للتنمية خلال شهر **جويلية 2022**



# تقدم إنجاز العنصر الثاني

(الإدماج الاقتصادي ودعم المنظومات المحلية المستدامة)



## 2. الإدماج الاقتصادي ودعم المنظومات المحلية المستدامة

**الهدف:** دعم إدماج العائلات المعوزة و المستغلات الفلاحية الصغيرة وصغار المربين في الاقتصاد المحلي والمنظومات المحلية.

وينقسم هذا العنصر إلى 03 عناصر فرعية:

1.2. تحسين البنية التحتية للإنتاج والتأقلم مع التغيرات المناخية،

2.2. دعم قدرات الفاعلين و الهياكل المهنية المحلية،

3.2. تثمين المنتجات المحلية والشراكات الاقتصادية.



## تقدم إنجاز العنصر 1.2

(تحسين البنية التحتية للإنتاج والتأقلم مع التغيرات المناخية)



## 1.2 تحسين البنية التحتية للإنتاج والتأقلم مع التغيرات المناخية

أشغال المحافظة على المياه و التربة:

- تم الإعلان عن طلب عروض لانتداب مكتب دراسات لتحديد مواقع **45** منشأة لتغذية المائدة بصدد إعداد تقرير تقييم العروض

- تم الإعلان عن طلب عروض لإعادة تهيئة مفرغ مصب السد الجبلي الوشتاتية بالسبيخة:  
تم استلام الأشغال بتاريخ: **14/07/2022** ( الكلفة: **198 أ. د** )

• تم بتاريخ **11/07/2022** إبرام اتفاقية مع ديوان تربية الماشية لغراسة **400 هك** هندي أملس،  
(الكلفة: **1,214 مليون د**)

• تم بتاريخ **16/03/2022** إبرام اتفاقية مع الوكالة العقارية الفلاحية لانجاز عنصر التسوية العقارية (**5000 هك**)  
(الكلفة: **1,812 مليون د**)، موزعة بكل من:

السبيخة **4000 هك** (بالشقاوية والشرفة)، الحاجب **1000 هك** (500 هك بالسودان و 500 هك بأولاد عامر)

- بصدد إعداد 03 دراسات لإعادة تهيئة 03 مناطق سقوية ( 320 هكتار): الحوفية بحفوز، شاكر بعين جلولة والنقاظة 1 و2 بحاجب العيون، (الكلفة: 70 أ.د.): نسبة تقدم الإنجاز 40%.
- تم إعداد الخطوط المرجعية وملف طلب العروض لدراسة 35 كلم مسالك فلاحية في كل من الوسلاتية، عين جلولة، العلا (أولاد عمر) وحاجب العيون (السرجة: السودان).
- تم الإعلان عن طلب عروض لانجاز 4 آبار مراقبة: تم إمضاء العقود وتم إعطاء الأذن الإدارية لانطلاق الأشغال لـ 03 آبار. (الكلفة: 413 أ.د.)

# مفرغ مصب السد الجبلي الوشتاتية بالسبيخة قبل التدخل





15/02/2022

## مفرغ مصب السد الجبلي الوشتاتية بالسبيخة بعد التدخل







## 3.2. تقيم المنتجات المحلية والشراكات الاقتصادية

تم برمجة منظومتين خلال سنة 2022:

- التين الشوكي
- العسل

بالنسبة للتين الشوكي قامت مصلحة المنظومات والشراكة بوحدة المشروع خلال شهر مارس 2022 بـ:

- تحديد مناطق الإنتاج والمساحات
- تحديد المتدخلين (صناعيين، منتجين،...)
- والآن بصدد إعداد خرائط لمناطق الإنتاج.
- كما تم الإعلان عن استشارة لانتداب مكتب دراسات لإعداد 03 مخططات أعمال (02 للتين الشوكي و 01 للعسل): بصدد إعداد تقرير تقييم العروض (آخر سبتمبر: انطلاق الدراسة).

سيتم تطوير شراكات مع مختلف المتدخلين ←

# تقدم إنجاز العنصر الثالث

(تسيير المشروع - المتابعة والتقييم وإدارة المعرفة)



## تسيير المشروع - المتابعة والتقييم وإدارة المعرفة

- تم إعداد دراسة الخطوط المرجعية للمشروع. (الكلفة: 99 أ.د.)،
- بصدد إعداد دراسة لتحديد إستراتيجية التواصل للمشروع. (الكلفة: 45 أ.د.)،
- بصدد إعداد موقع واب للمشروع (الكلفة: 21 أ.د.)،
- تم اقتناء 6 شاحنات ر. د على موارد القرض: بصدد إعداد إجراءات التسليم.
- تم الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 05 شاحنات ر. د على موارد الخزينة: طلب عروض غير مثمر للمرة الثانية
- تم برمجة تصليح 10 شاحنات ر. د معطبة (المندوبية غير قادرة على إصلاحهم): تم تصليح 6 شاحنات

تقدم الإنجاز المالي

(إلى غاية 22 سبتمبر 2022)

## متابعة تقدم انجاز المخطط التقديري للصفقات 2022/2021 ( 64 657 أ. د )

تقدم الانجاز	المنجز إلى غاية 22 - 09 - 2022	المبرمج	طريقة إبرام الصفقة
	العدد	العدد	
29%	06	21	طلب عروض
56%	18	32	إستشارات
44%	04	09	إتفاقيات
<b>53%</b>	28	53	الجملة

## التعهدات الجمالية للمشروع إلى غاية 22 - 09 - 2022 حسب المخطط التقديري للصفقات

الوحدة: أ.د

المكونات	قرض FIDA	هبة FIDA	هبة FACC	الميزانية	الجملة
خدمات	28 444	25	3 672	8261	40 402
تجهيزات و معدات	655	114	10	149	928
أشغال	0	0	1599	304	1 903
<b>الجملة</b>	<b>29 099</b>	<b>139</b>	<b>5 281</b>	<b>8714</b>	<b>43 233</b>

نسبة التعهد حسب ما هو مبرمج بالمخطط التقديري: **66 %**

نسبة التعهد حسب كلفة المشروع: **28 %**



**برنامج المشروع خلال سنوات  
2024 – 2023 – 2022/2021**

## برنامج تدخلات المشروع وتقدم الإنجاز خلال سنتي 2021-2022 (الوحدة: ألف دينار)

المكونات	الوحدة	الكمية	الكلفة	تقدم الانجاز
تسهيل الشراكات وإعداد مخططات الأعمال (لمنظومتني: التين الشوكي و العسل)	مخطط أعمال	03	100	بصدد إعداد تقرير تقييم العروض
دراسات لإعادة تهيئة مشاريع م ص ش	دراسة	05	105	40
دراسات لإعادة تهيئة مناطق س	دراسة	04	70	50
إعادة تهيئة مشروع المسلسل للماء الصالح للشرب	مشروع	1	5000	تم الإعلان عن طلب العروض
دراسة المسالك الفلاحية (القسط الأول): 30 كلم	دراسة	1	50	بصدد إعداد ملف طلب العروض
إعادة تهيئة 02 مناطق س (الحوفية + شاكرا)	هك	123	1600	في انتظار انتهاء الدراسات
دعم قدرات مجامع التنمية	مجمع	11	65	بصدد التشخيص
دعم قدرات الشركات التعاونية	ش ت		65	بصدد التشخيص
إعادة تهيئة مفرغ فيضان السد الجبلي الوشتانية		1	198	تم قبول الأشغال بتاريخ 14/07/2022
إبرام اتفاقية مع UTSS	اتفاقية	1	37000	تم ابرام الاتفاقية بتاريخ 18 أوت 2021
إبرام اتفاقية مع الوكالة العقارية الفلاحية	اتفاقية	1	1812	تم ابرام الاتفاقية بتاريخ 16 مارس 2022
إبرام اتفاقية مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى	اتفاقية	1	1214	اتم ابرام الاتفاقية بتاريخ 11 جويلية 2022
<b>الجملة</b>			<b>47279</b>	

## برنامج المشروع خلال سنة 2023 (الوحدة: ألف دينار)

المكونات	الوحدة	الكمية	الكلفة	ملاحظات
تسهيل الشراكات وإعداد مخططات الأعمال (لمنظومات: دجاج الضيعة، الزيتون و اللوز)	مخطط أعمال	03	240	
دعم وتمويل الشراكات ( FIDA % 70 )	شراكة		1340	في انتظار إعداد مخططات الاعمال
إعادة تهيئة مشروع <b>مقرة</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	4700	الإعلان عن طلب العروض في أكتوبر 2022
إعادة تهيئة مشروع <b>الدبابشة</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	1000	في انتظار الانتهاء من الدراسات
إعادة تهيئة مشروع <b>السرجة</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	4000	في انتظار الانتهاء من الدراسات
إعادة تهيئة المنطقة س ( <b>الحوافية وشاكر</b> )	هك	123	2500	في انتظار الانتهاء من الدراسات
دراسة المسالك الفلاحية ( <b>القسط الثاني</b> ): 30 كلم	دراسة	1	50	في انتظار تحديد المجموعة الثانية من الوحدات الاجتماعية
أشغال تهيئة المسالك الفلاحية ( <b>القسط الأول</b> )	كلم	30	9000	في انتظار الانتهاء من الدراسات
أشغال منشآت تغذية المائدة	منشأة	25	500	تحديد المواقع حسب نتائج الدراسة
بناء مواجل فردية وتجهيزها	ماجل	60	900	بعد التشخيص الميداني
أنشطة مدرة للدخل	مشروع	800	12000	بعد التشخيص الميداني والدراسات الفنية ومصادقة المجالس المحلية ولجان الإسناد
<b>الجملة</b>			<b>36130</b>	

## برنامج المشروع خلال سنة 2024 (الوحدة: ألف دينار)

المكونات	الوحدة	الكمية	الكلفة	ملاحظات
تسهيل الشراكات وإعداد مخططات الأعمال (لمنظومات: المشمش، لحم الماعز والضأن و النباتات الطبية والعطرية)	مخطط أعمال	03	360	
دعم وتمويل الشراكات ( FIDA % 70 )	شراكة	-	3000	
إعادة تهيئة مشروع <b>بودبوس</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	1030	
إعادة تهيئة مشروع <b>العالية</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	1300	
إعادة تهيئة مشروع <b>الرحمة</b> للماء الصالح للشرب	مشروع	1	1500	
دراسة المسالك الفلاحية ( <b>القسط الثالث</b> ): 30 كلم	دراسة	1	70	في انتظار تحديد المجموعة الثالثة من الوحدات الاجتماعية
أشغال تهيئة المسالك الفلاحية ( <b>القسط الثاني</b> )	كلم	30	9000	
أشغال منشآت تغذية المائدة	منشأة	25	625	
بناء مواجل فردية وتجهيزها	ماجل	60	900	
أنشطة مدرة للدخل	مشروع	1500	22500	بعد التشخيص الميداني والدراسات الفنية ومصادقة المجالس المحلية ولجان الإسناد
<b>الجملة</b>			<b>40285</b>	

## توقعات تعهدات المشروع إلى غاية سنة 2024

جملة الاستثمارات المبرمجة إلى غاية سنة 2024: 123,694 مليون د.

و بذلك ستصل نسبة التعهدات: 80% من كلفة المشروع إلى غاية  
سنة 2024



وشكرا على حسن الانتباه

